ИНФОРМАЦИЯ
о ходе исполнения утвержденной Инвестиционной программы за I квартал 2024 года по АО Астана-Энергия

Инвестиционная программа 2024 года

№ п/п	Наименование инвестиций	План на 2024 г., тыс.тенге.	Примечание
1	2	3	4
	ИТОГО:	**2 326 687**	
	ТЭЦ-1	**53 463**	
1	Приобретение пылемеров (5 шт.)	53 463	Ведутся конкурсные процедуры
	ТЭЦ-2	**2 259 745**	
2	Капитальный ремонт к/а Е-550-13,8-560КТ, ст.№7	1 048 605	Договор заключен
3	Капитальный ремонт к/а БКЗ-420-140, ст.№1	1 048 605	Договор заключен
4	Приобретение вал с дисками ротора ММТ - 2 шт. (ММТ 2600-2550-600К)	39 227	Ведутся конкурсные процедуры
5	Приобретение ротор дымососа с корпусами подшипников - 4 шт.	123 309	Ведутся конкурсные процедуры
	Районные котельные	**13 478**	
6	Приобретение электродвигателя для сетевых насосов (2 шт.)	2 633	Ведутся конкурсные процедуры
7	Приобретение дымососа с электродвигателем (1 шт.)	2 400	Ведутся конкурсные процедуры
8	Приобретение дутьевого вентилятора с электродвигателями (3 шт.)	1 046	Ведутся конкурсные процедуры
9	Приобретение погрузчика (1 шт.)	7 400	Ведутся конкурсные процедуры

Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№1 ТЭЦ-2

АСТАНА ЭНЕРГИЯ

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА:

- **Капитальный ремонт к/а №1**
- Подрядная организация –

ТОО «КазЭнергоПромСервис»

- Начало ремонта **– 01.04.2024г.**
- Окончание ремонта **– 01.07.2024г.**

ОБЪЕМ РАБОТ:

1. Замена горелок – 8 шт.
2. Замена пакетов ХПП – 13 шт.
3. Замена пакетов водяного экономайзера
   I ступень – 62 шт.
4. Замена пакетов водяного экономайзера
   II ступень – 13 шт.
5. Замена шнеков ПСУ.
6. Ремонт вспомогательного оборудования.
7. Замена течек БСУ – 100%.

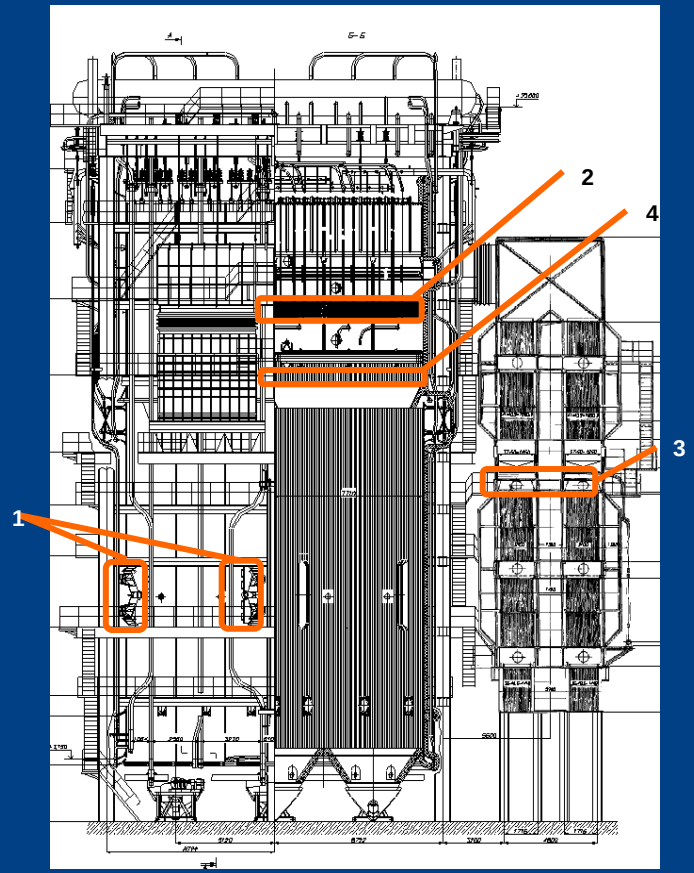

Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№7 ТЭЦ-2

АСТАНА ЭНЕРГИЯ

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА:

- **Капитальный ремонт к/а №7**
- Подрядная организация –

ТОО «Астанастройэнерго»

- Начало ремонта **– 02.07.2024г.**
- Окончание ремонта **– 30.09.2024г.**

ОБЪЕМ РАБОТ:

1. Замена микроблоков ВЭ II ступени – 32 шт.
2. Замена участков НПП.
3. Ремонт горелок с наплавкой.
4. Замена шнеков ПСУ.
5. Ремонт вспомогательного оборудования.
